

H24. 6. 2 に資材が到着 6月2日、3日、9日、10日、16日、22日～24日、29日、30日、7月1日の11日間 基礎が7日間(5月中)
予定どおりの6月中に完成できた。1人でできるか心配でしたが、自分なりに、よくできたと思う。



観音ドアは、右が下がり
蝶番を1つ入れた



転び止めは、1本だけ入らず
5mm切った




隅木は、見た目はいいが、乾燥で、
かなり「ねじれ」、隙間がでた



破風板の屋根側にやや隙間ができ
シール材を入れた



屋根パネルの前後は、前面が、合わず
やや難しかった

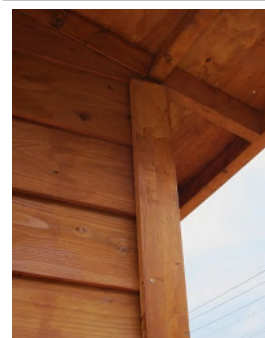

古い物置とは、間隔を60cm離れた





アスファルトシングルは、開封しない物が
1束残った。どこか張り忘れたのか？



屋根の頂上が、少し変な感じで、仕上がった
破風板との間に、シール材を入れた



45mmコークスクリューは、
かなり打ちずらかった

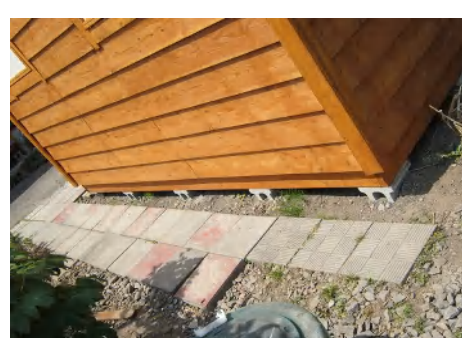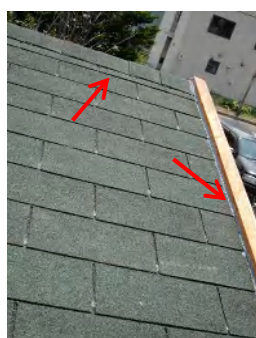

板材を、千鳥で並べる事を知らず、
同じ材料をはり、途中から張り替えた



基礎は、慎重に時間をかけたので(7日間)
パッキン材はかろうじて、使用しなかった



トラス材は、手伝いの居る時に、
まとめて上にあげた。



トラス材は、1人での作業は
かなりきついでした



壁パネルの隙間は、ややあり。
12cmのコークスクリューは、どこで
打つのか？、全部あまりました



9cmのコークスクリューは、
ちょっと足りなかった。
どこか打ちすぎたか？

大きいバイクが入れるので、強化床材
にした。最後の1枚がなかなか入ら
ずらかった



バイクと自転車1台「男の隠れ家」ができました。
後は、電気とストーブと棚をつくります。

